



Ausschuss für Mobilität

Bauablaufkonzept „Soltau Straße“

Lüneburg, 08.04.2026


Bauablaufkonzept „Soltauer Straße“

Bauphase 0: Aktuelle Situation



Bauphase 0:

- Beschreibt aktuelle Situation
- Vollsperrung Soltauer Straße durch Brückenneubau
- Umleitungsverkehre über Munstermannskamp (beide RiFa's)

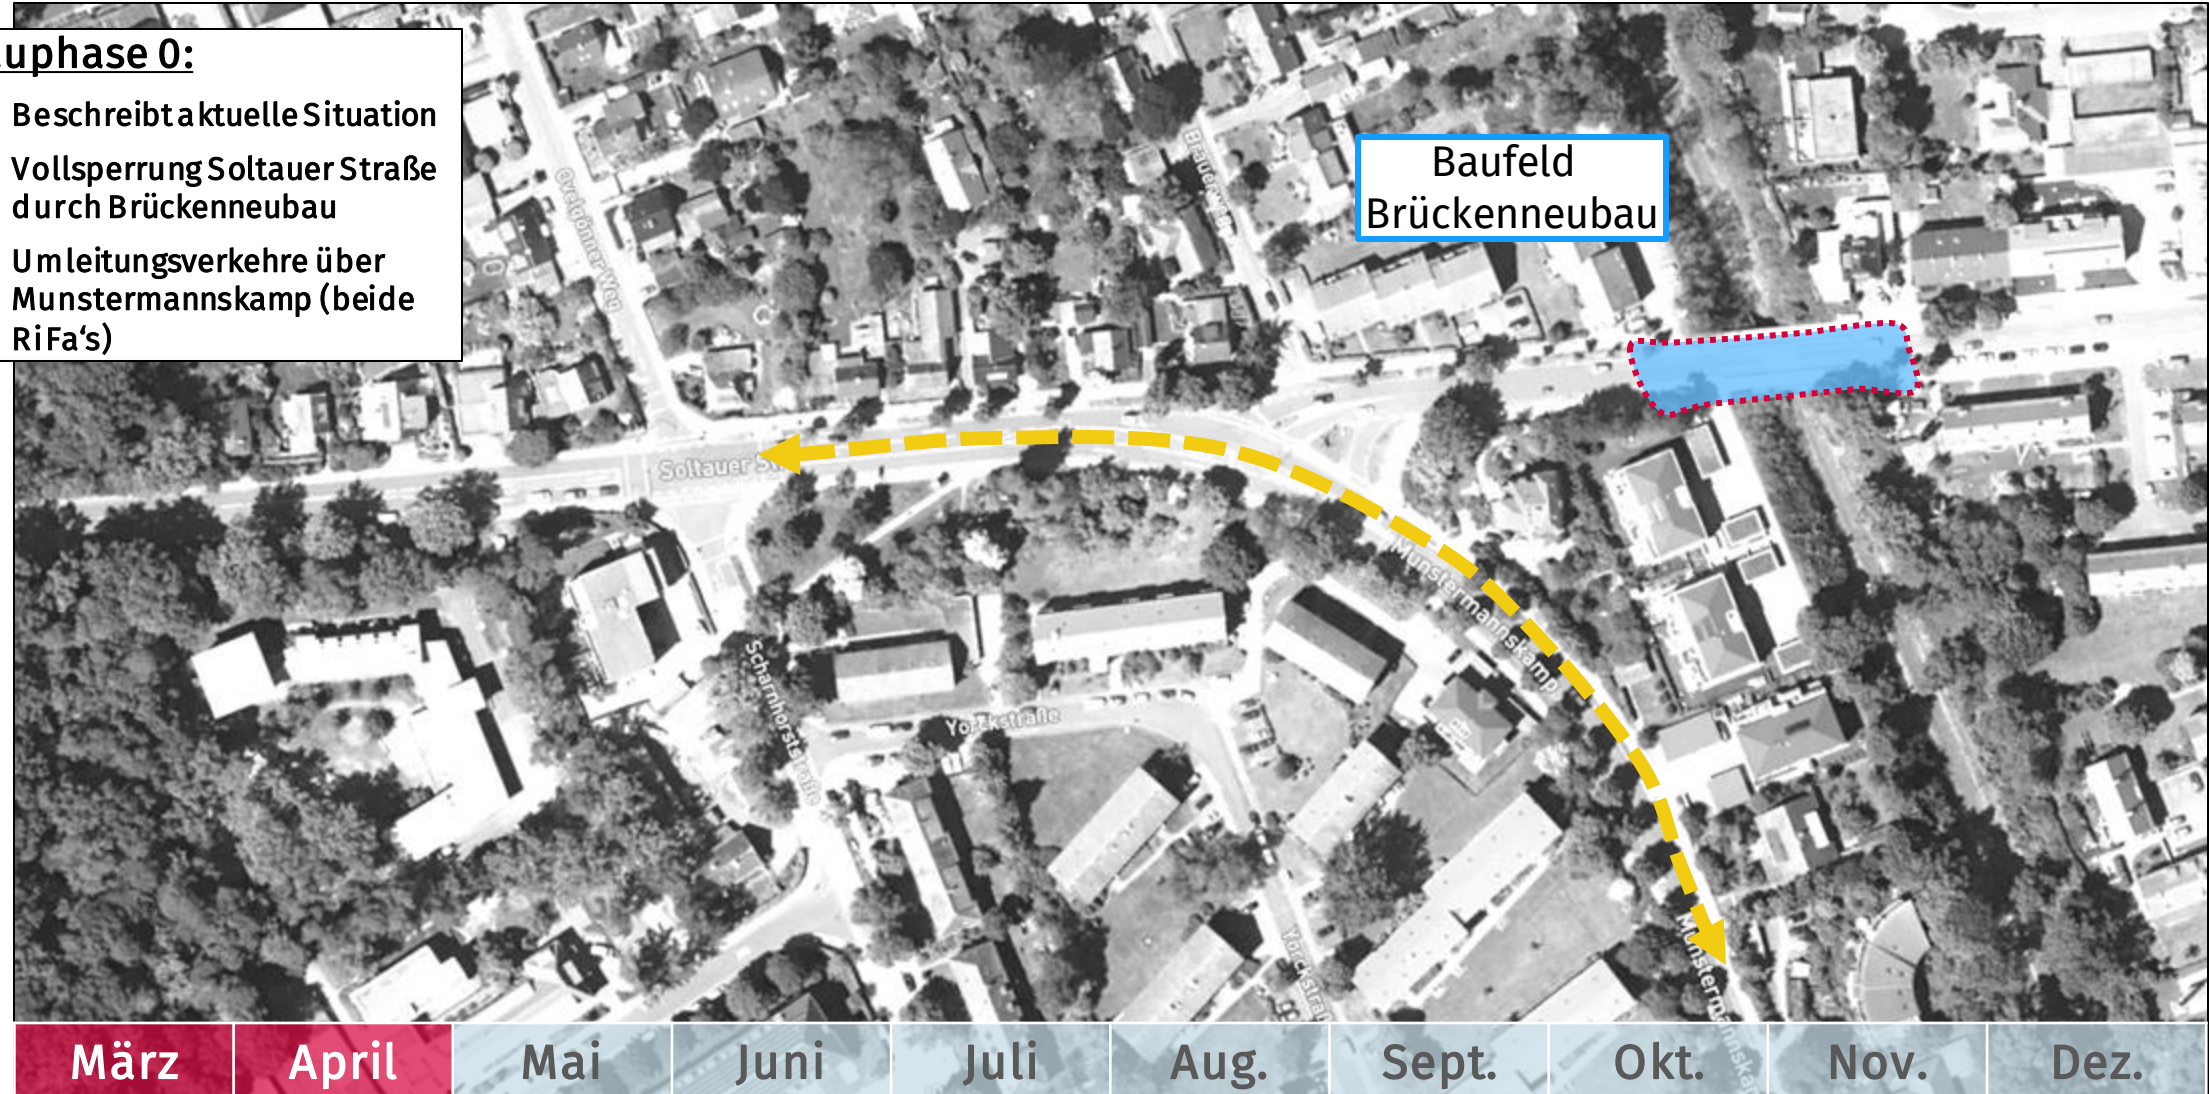

März

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.


Bauablaufkonzept „Soltauer Straße“

Bauphase 1: Straßenbau „Soltauer Straße“



Bauphase 1:

- Vollsperrung Soltauer Straße durch Brückenneubau
- Straßenbau nördl. Brückenbaufeld
- Umleitungsverkehre über Munstermannskamp (beide RiFa's)

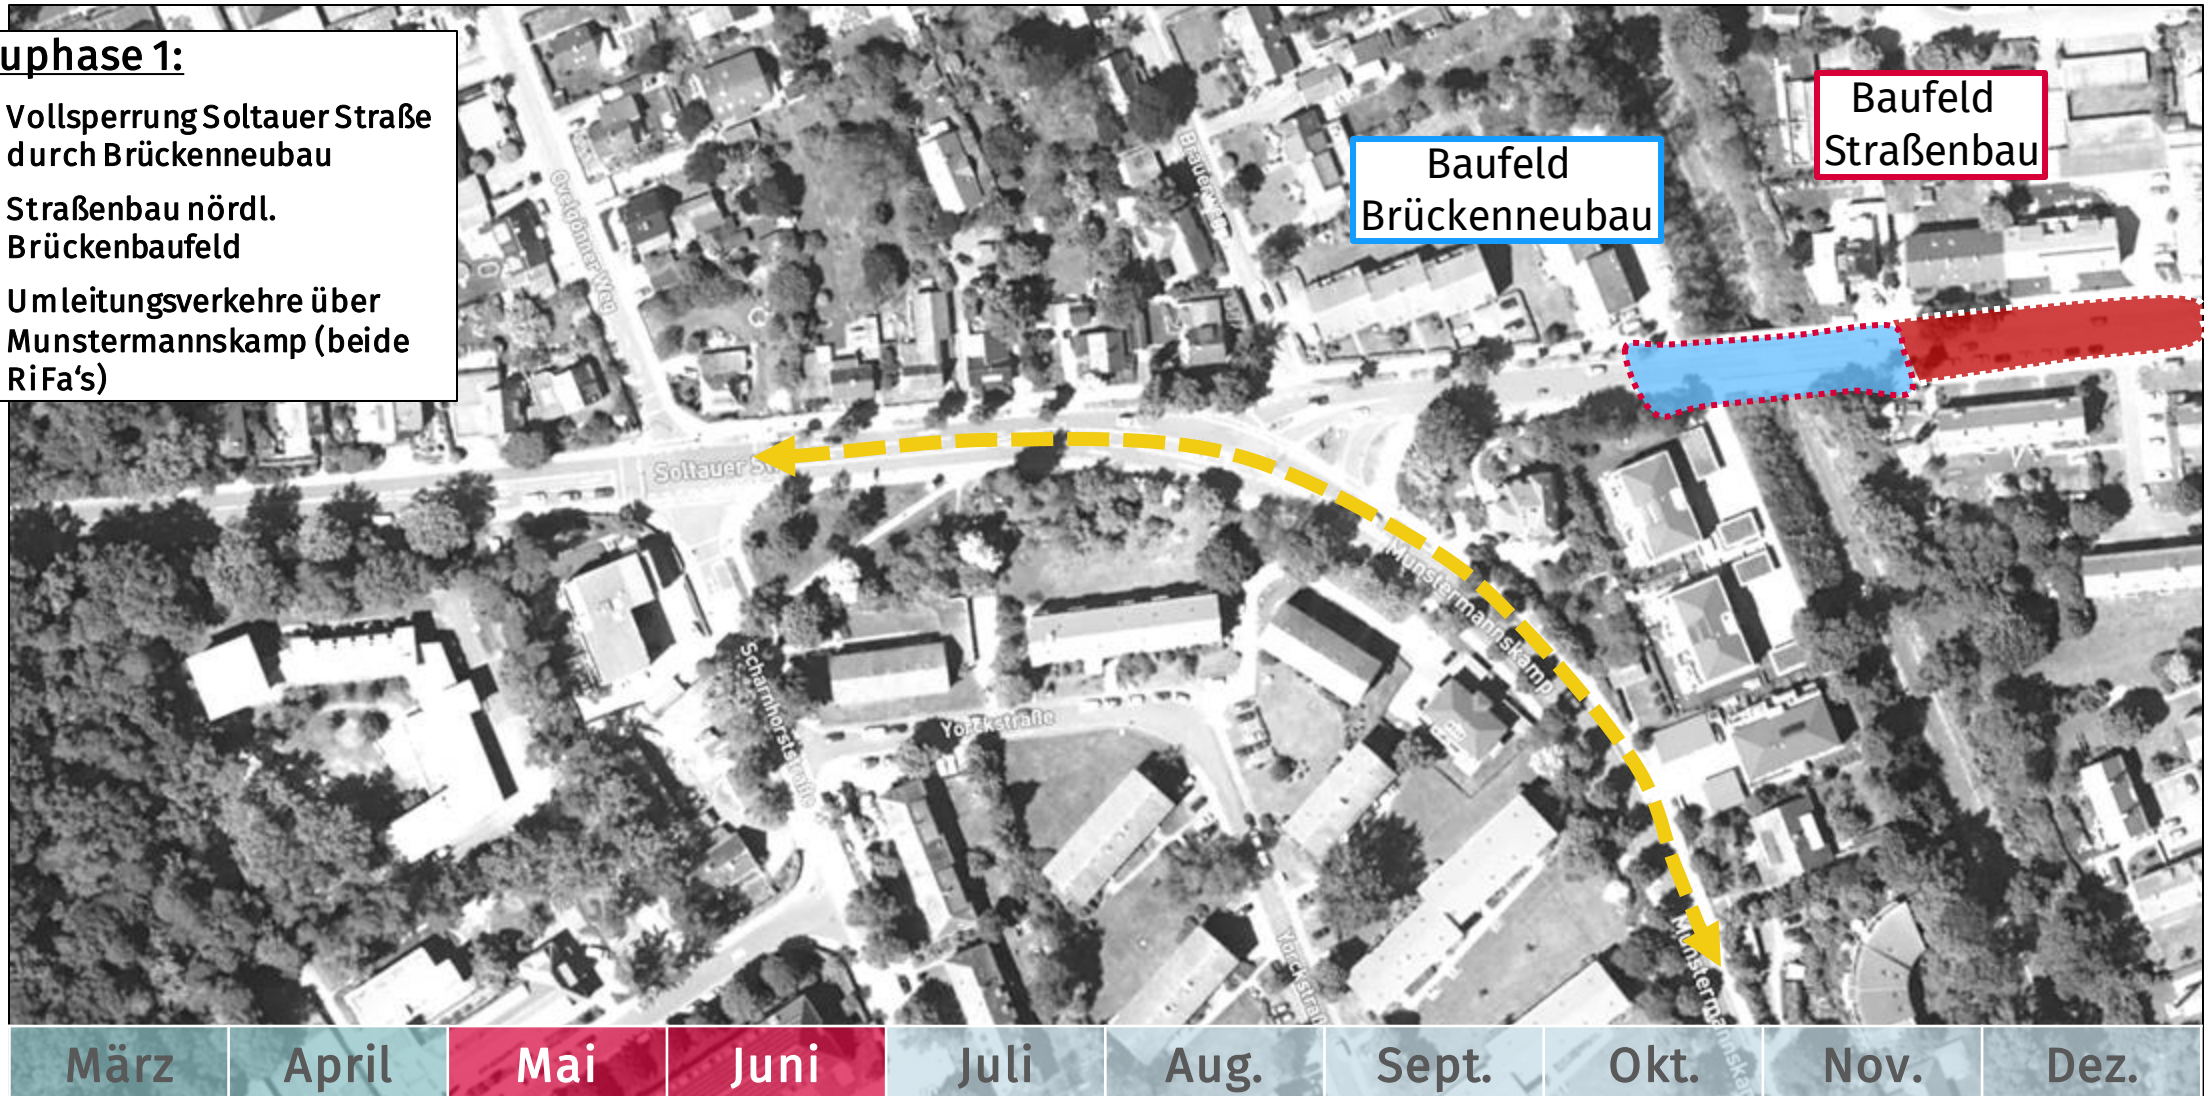

März

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.



Bauablaufkonzept „Soltauer Straße“

Bauphase 2: Vollsperrung „Munstermannskamp“



Bauphase 2:

- Vollsperrung Soltauer Straße durch **Brückenneubau** dauert an
- Vollsperrung **Munstermannskamp** durch Straßenbau südlich Brückenbaufeld
- Umleitungsverkehr über Scharnhorststr./Blücherstr.

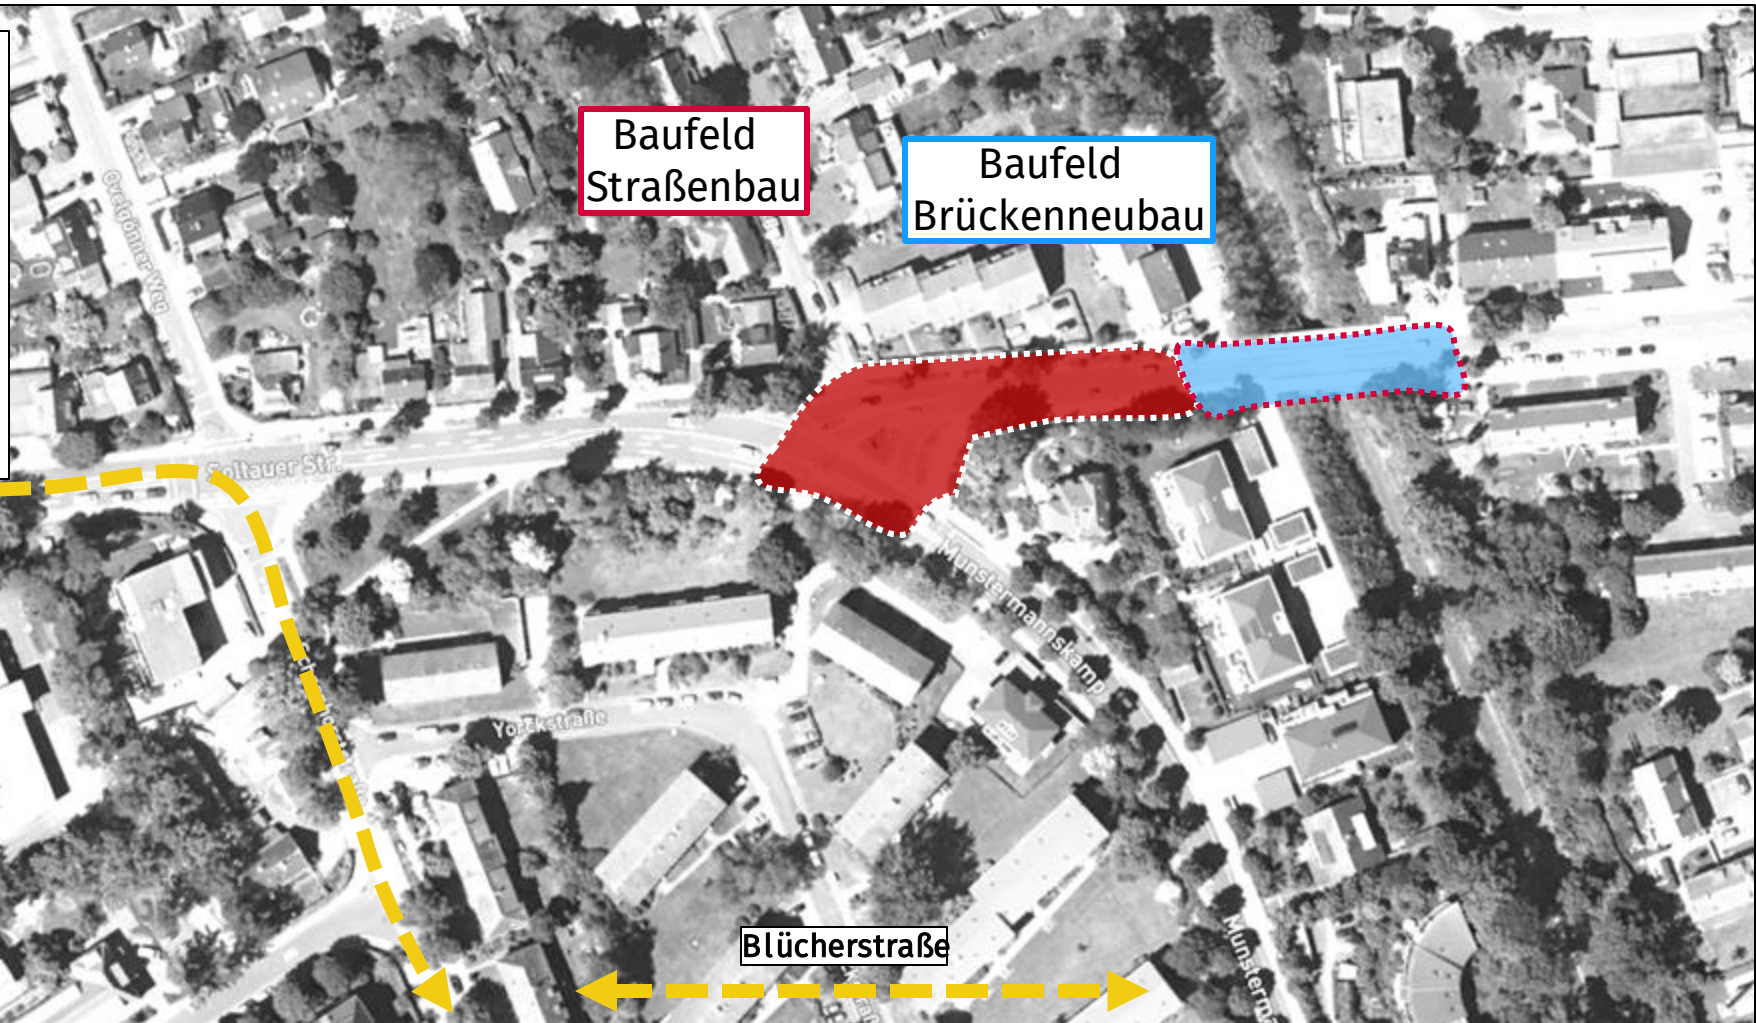

Bauablaufkonzept „Soltauer Straße“


Bauphase 3a: „5-Jahres-Plan Soltauer Straße“



Bauphase 3a:

- **Soltauer Straße / Munstermannskamp**
Vollsperrung aufgehoben
- Einrichtung 1. BA Straßenbau 5-Jahres-Plan auf Soltauer Straße (halbseitige Bauweise)
- Einbahnstraßenführung stadteinwärts (Hauptlast)
- Zufahrt **Scharnhorststr.** gesperrt

avacon

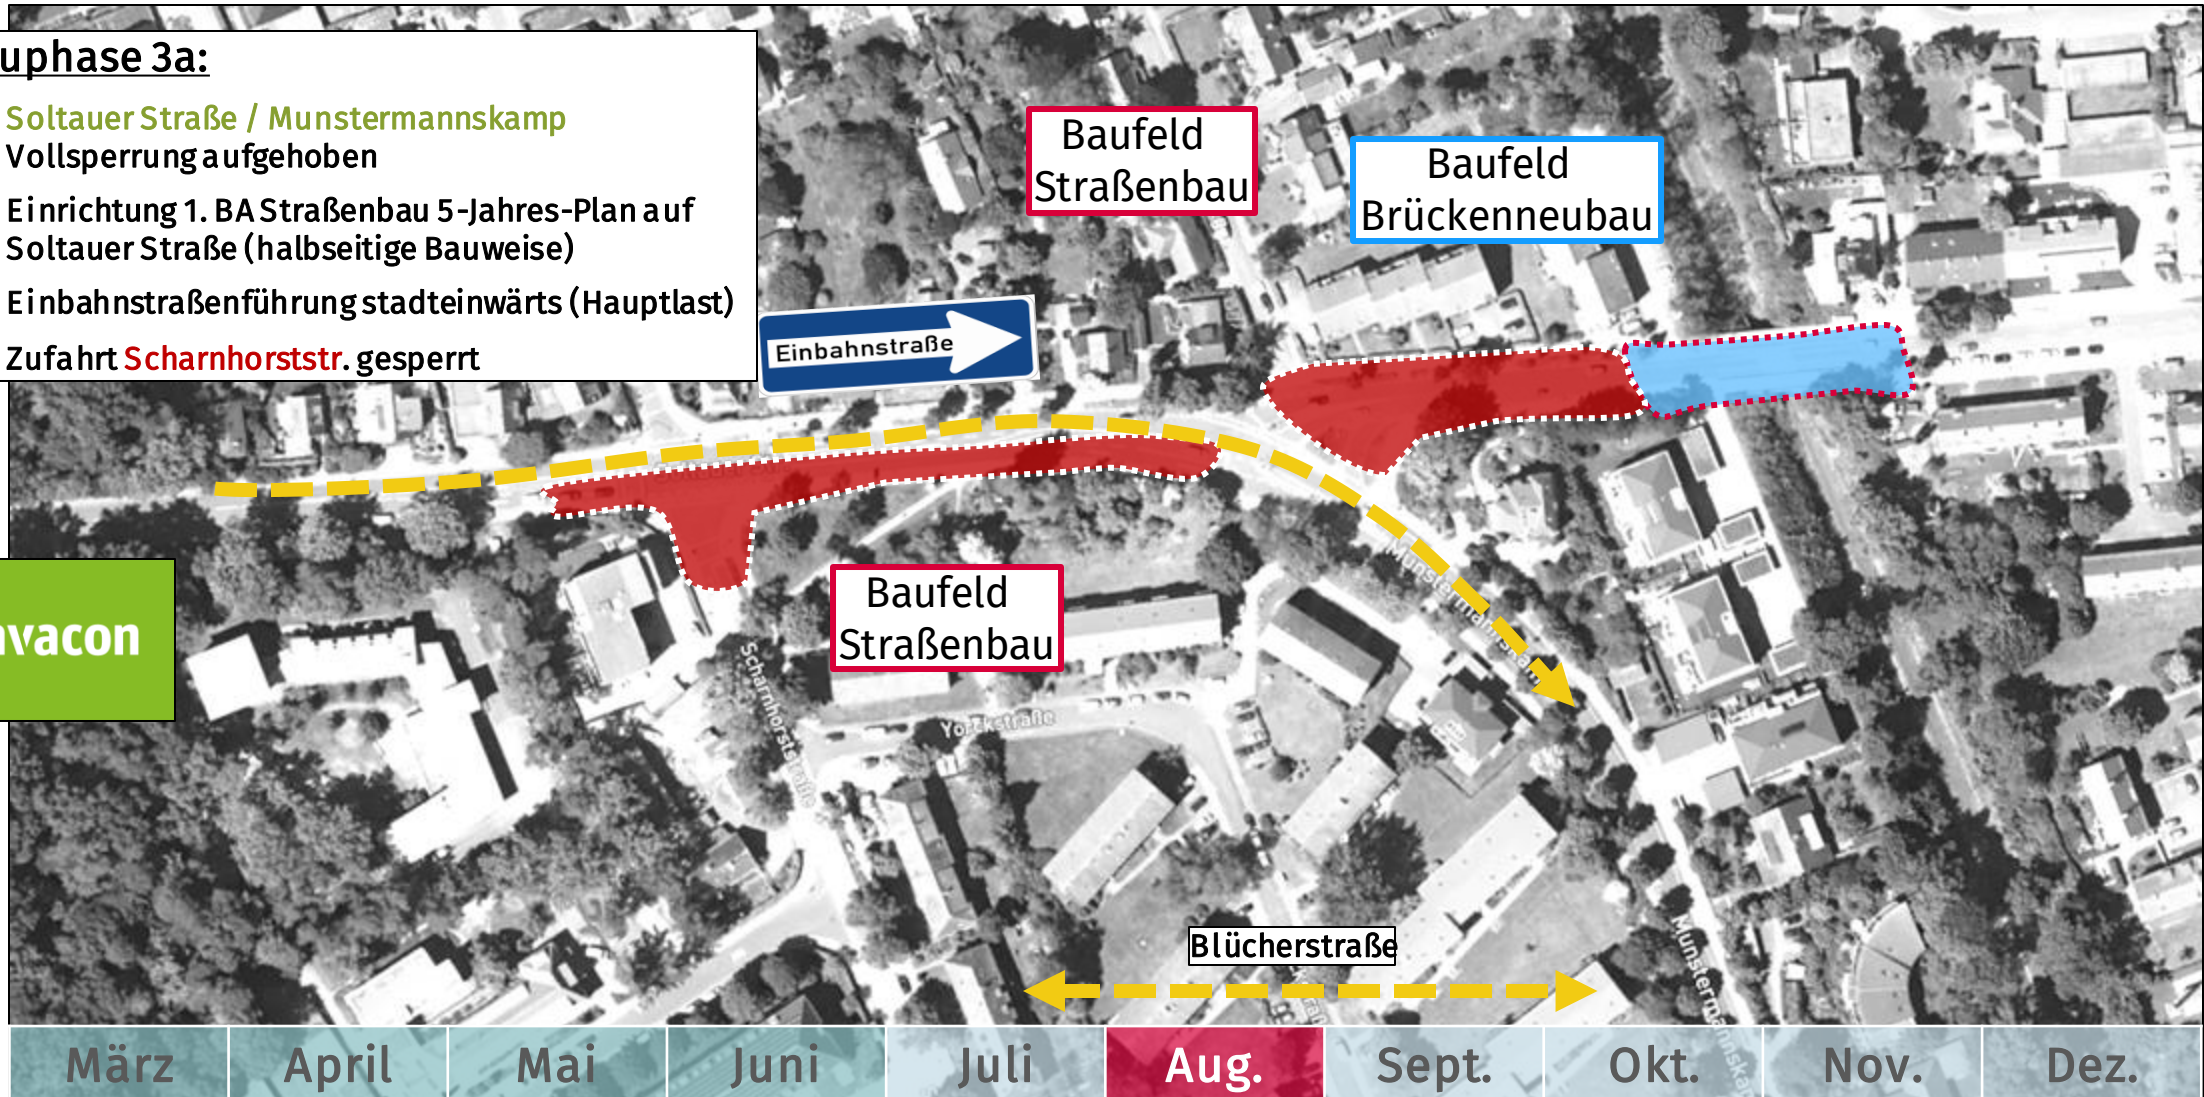


Bauablaufkonzept „Soltauer Straße“

Bauphase 3a: „5-Jahres-Plan Soltauer Straße“ (Alternative)




Bauphase 3a:

- **Soltauer Straße / Munstermannskamp**
Vollsperrung aufgehoben
- Einrichtung 1. BA Straßenbau 5-Jahres-Plan auf Soltauer Straße (halbseitige Bauweise)
- Verkehrsführung mit temp. LSA
- Zufahrt **Scharnhorststr.** gesperrt

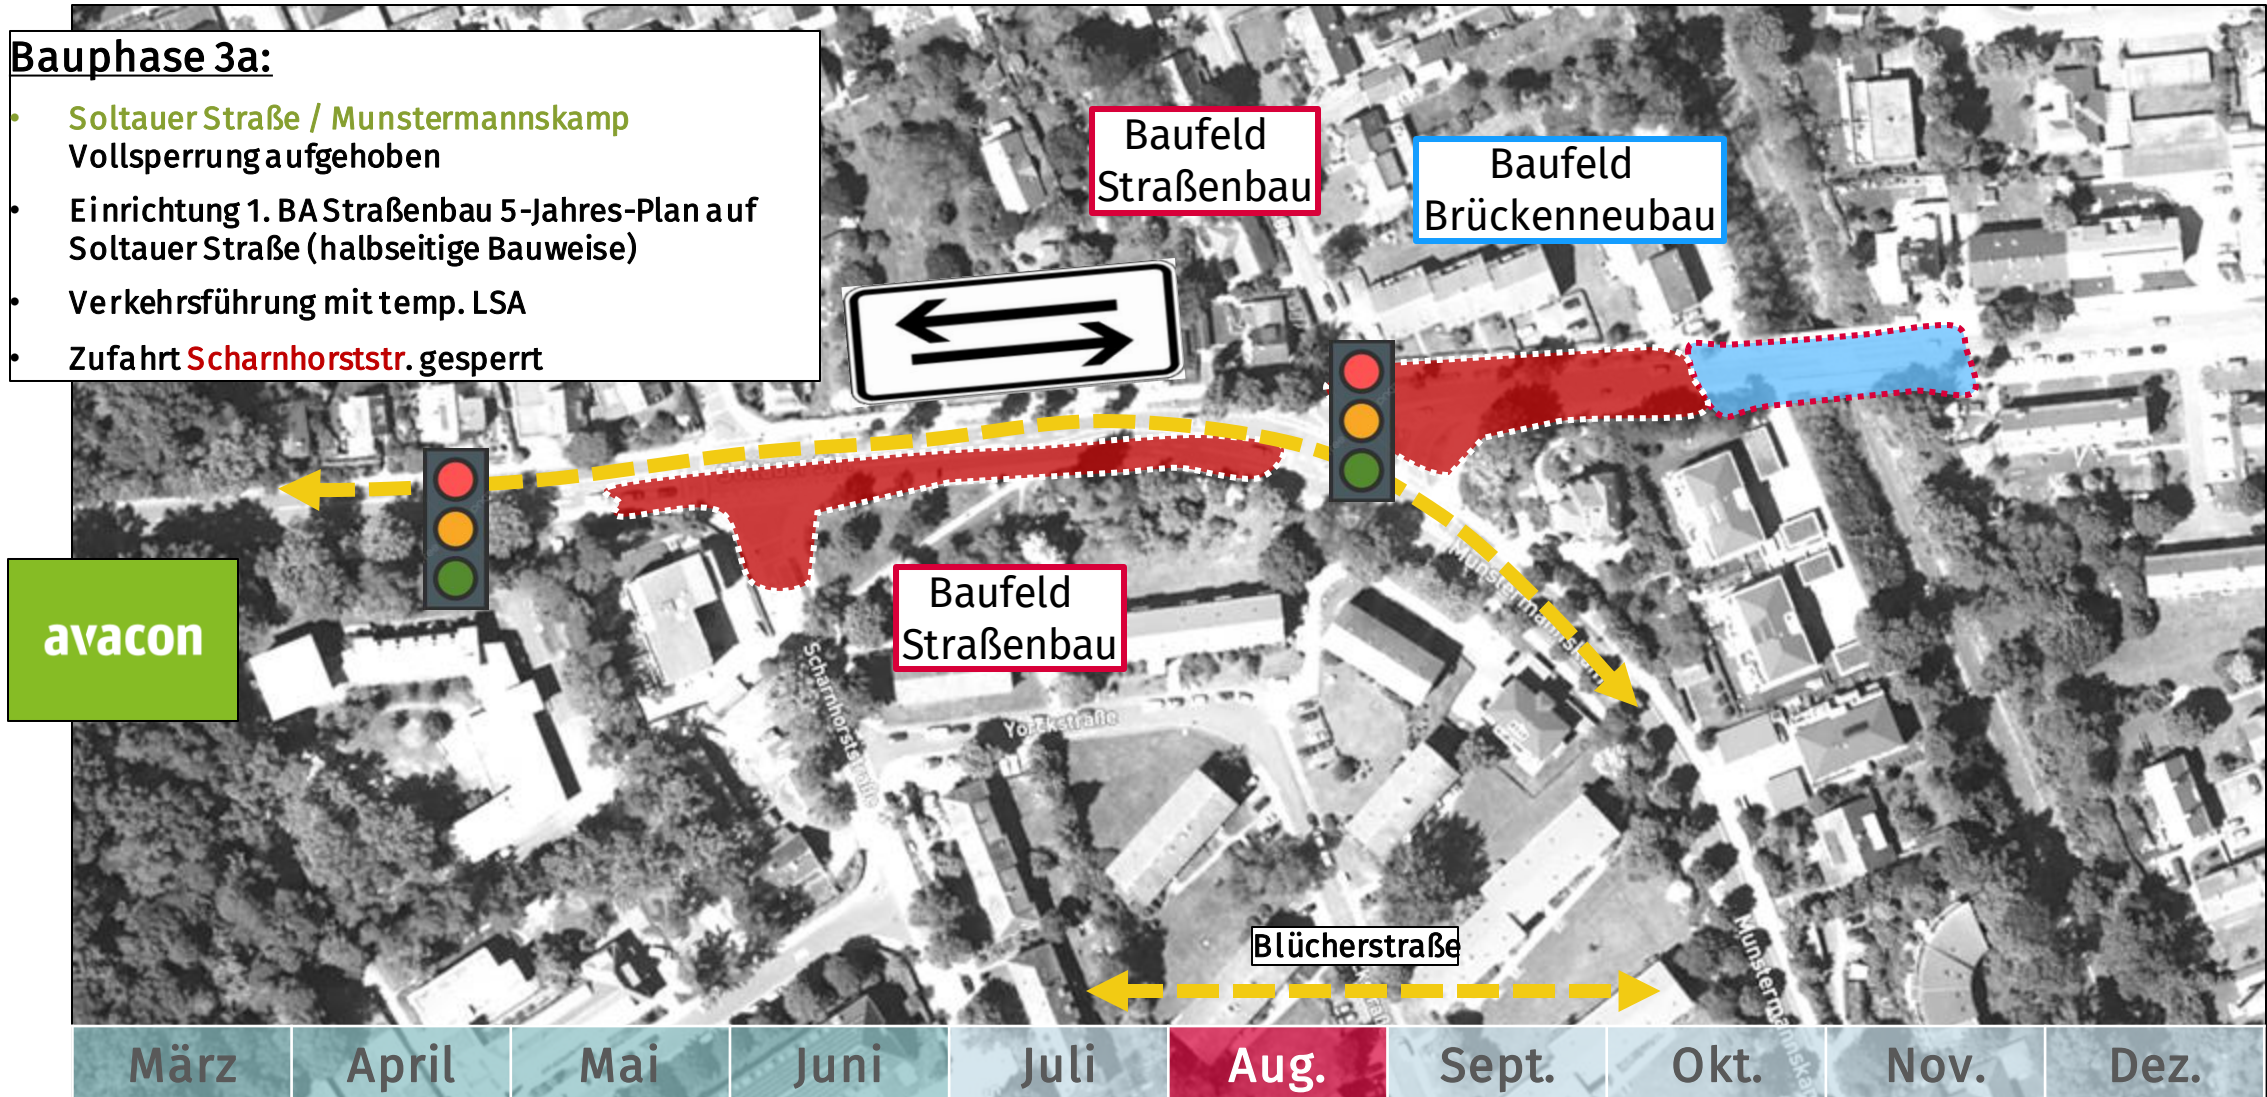


Bauablaufkonzept „Soltauer Straße“

Bauphase 3b: „5-Jahres-Plan Soltauer Straße“

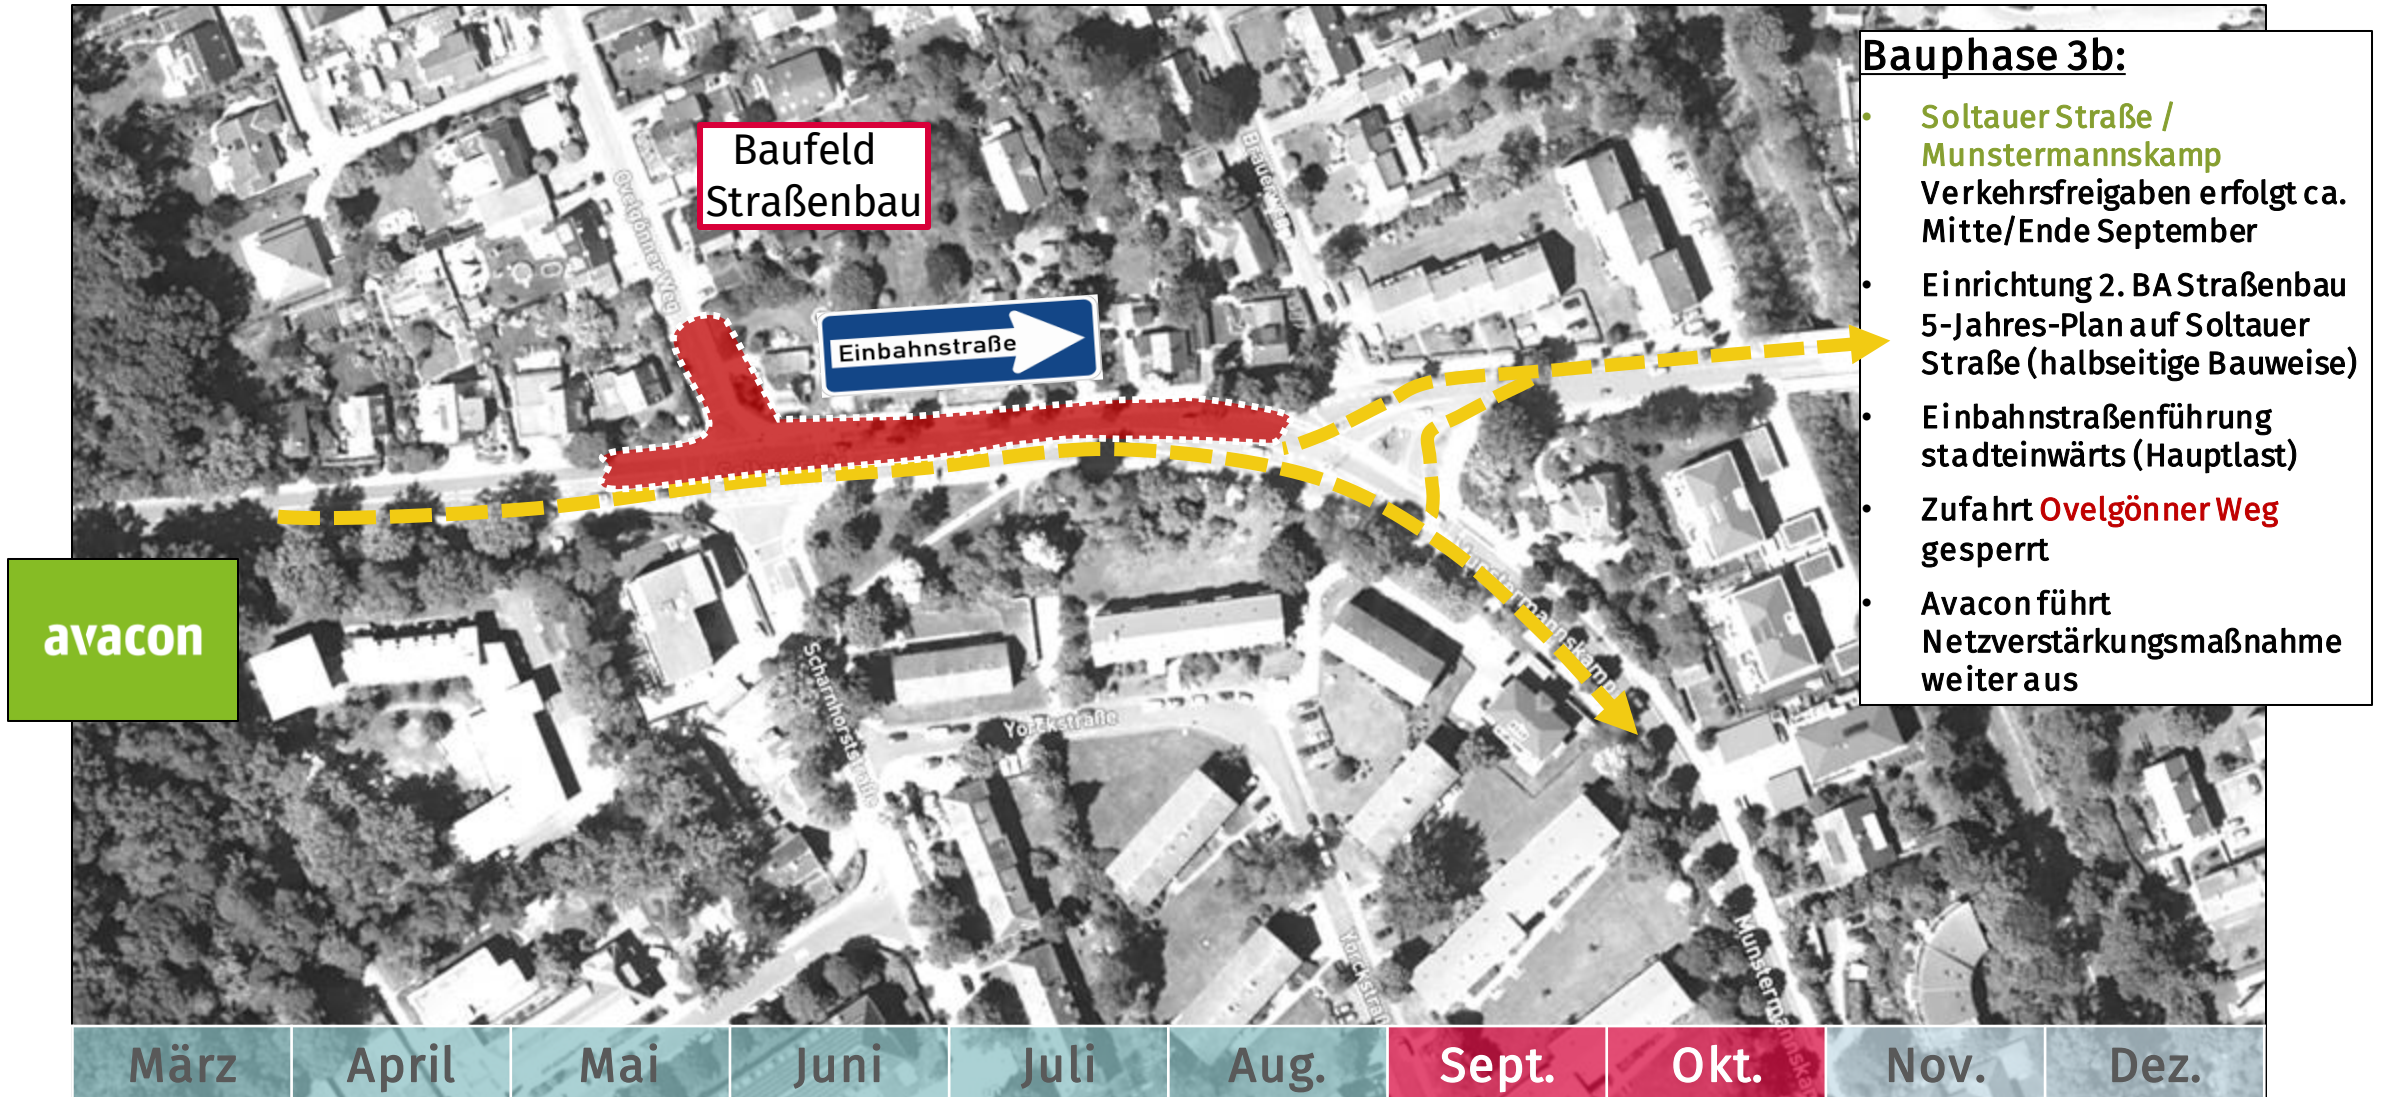

Bauablaufkonzept „Soltauer Straße“

Bauphase 3b: „5-Jahres-Plan Soltauer Straße“ (Alternative)

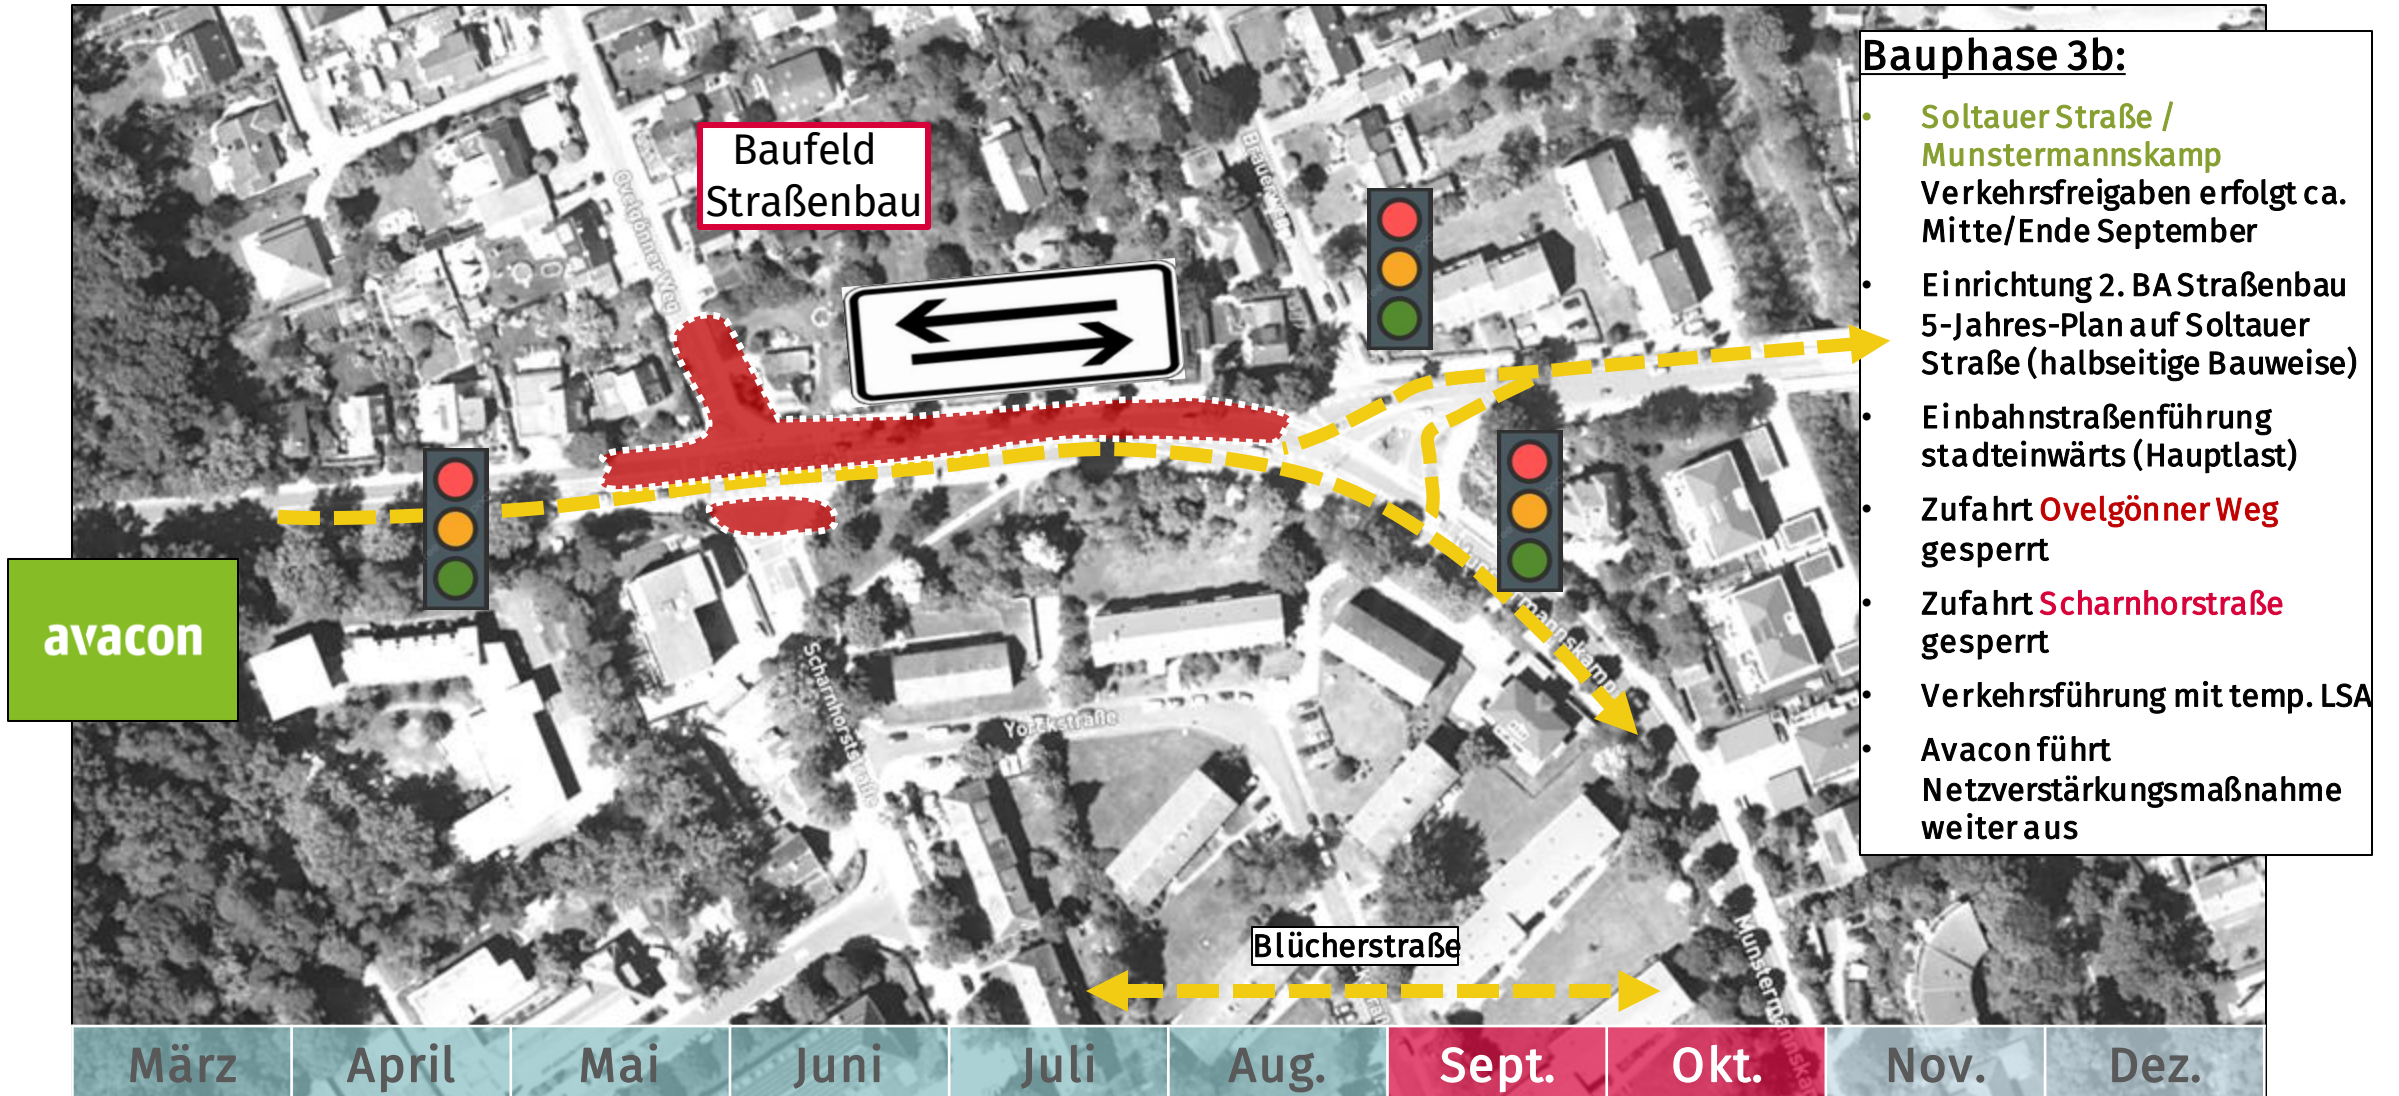

Bauablaufkonzept „Soltauer Straße“

Bauphase 4: Straßen- und Brückenneubau Hansestadt abgeschlossen



Bauphase 4:

- Soltauer Straße / Munstermannskamp Verkehrsfreigaben erfolgt
- Avacon beendet Netzverstärkungsmaßnahme

avacon

März

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.


Nov.

Dez.



geplante Informationstermine:

- **Informationsveranstaltung Oedeme:**
 - 4. Mai, 18.30 Uhr Stadtteilhaus Oedeme, OASE, Im Dorf 2
- **Informationsveranstaltung Häcklingen/Rettmer:**
 - 5. Mai, 18.30 Uhr Bonhoeffer-Haus, Margarete-Endemann-Weg 1



Fachbereich 7
Alexander Matz
Neue Sülze 35, 21335 Lüneburg

04131 / 309 - 3476
alexander.matz@stadt.lueneburg.de

